黑龙江宏通热力有限公司

一级网注水方案

2016——2017年

编制:许长伟

审核:

审定:

2016-9-25 实施

目 录

第一章 简介

-,	概述	错误!未定义书签。
=,	组织结构图	错误!未定义书签。
	第二章	供热预备
三、	供热管网冲洗方案	错误!未定义书签。
四、	供热冷运行方案	错误!未定义书签。
五、	升温及试运行	错误!未定义书签。
	第三章	供热运行
<u>,,,</u>	供热运行时刻治理	错误!未定义书签。
七、	季节工数量操纵	错误!未定义书签。
八、	供热运行	错误!未定义书签。
九、	停止供热	错误!未定义书签。
+,	紧急事件及处置方案	错误!未定义书签。
	第四章	热线服务
+-	-、服务要领	错误!未定义书签。
+=	二、热线应答	错误!未定义书签。
+=	三、通话声音	错误!未定义书签。
十四	1、用户回访	错误!未定义书签。
	第五章	耐 录
+≢	L、2015-2016 供暖季水压图	量错误!未定义书签。

十六、	热源厂供/回水温度调剂表	.错误!未定义书签。
十七、	供热管网注水记录表	.错误!未定义书签。
十八、	2015-2016 供热系统注水时刻安排	.错误!未定义书签。
十九、	运行人员职责	错误!未定义书签。
二十、	****热力**有限公司运行供热突发事件应急	急预案 错误!未定义
书签。		

二十一、**热力**有限公司消防应急预案......**错误!未定义书签。

第一章 简介

一、概述

、目的

为增强《黑龙江宏通热力》呼兰利民开发区城市供热运行治理,规范供热操作流程,确保呼兰利民开发区 2016—2017 供热运行工作安全、高效地开展,进一步提升公司的服务质量和员工职业素养,充分表现"辛苦万万次,温暖每一家"的服务宗旨,更好地树立黑龙江宏通热力有限公司的良好企业形象,特制定本注水方案及有关操作规程。

- 、编制依据
- a)《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014
- b)《城镇供热系统运行保护技术规范》CJJ88-2014
- c)《城镇供热直埋热水管道技术规范》CJJ/T81-2013
- 、运行简介
- 、热源及供热运行方式

黑龙江宏通热力有限公司作为呼兰利民开发区唯一热源,热源分为一热源和二热源。依照热力公司要求,供热管网建设至今,一级管网单向总长度千米左右。管网从一、二热源厂引出 DN800 管线,2016年增加一级网 DN600 管线 180米、DN250 管线 1470米、DN150 管线 2016米,共计新增加一级网水量为 148吨,整体大网供需补水量 4084吨,管网覆盖整个利民开发区。形成供热能力 900 万平方米。热源提

供不高于130℃的热水。该热水通过热力首站进行热量互换后,返回 热源,由首站供出的热水通过城区供热管网进入各热用户热力换热 站,经再次换热后被送入用户管网。

供热首站由黑龙江宏通热力有限公司统一运行治理,各项运行参数及供热管网的初调剂由生技室组织操作与调剂,保证知足热力公司 所要求的各项运行参数。

、热力站

本年度估量运行社区热力换热站82座,其中自管换热站5座。

、热负荷及运行时刻

本运行季估量供热面积达 917 万平方米,截止 2016 年末供热面积估量增加 30 万 m²。供热运行时刻为 2016 年 10 月 15 日凌晨零点至 2017 年 4 月 20 日凌晨零点,共计 185 天,运行方式采纳全天 24 小时不中断供热运行。

、供热首站设备型号及规格

烟气处理量	M ₃ /h	360000
过滤面积	m²	6060
阻力	Pa	<1200
除尘效率	η	%
功率	Kw	50
数量	套	2
电压	KV	
电压生产厂家		哈尔滨东方能源环境有限公司
入口烟气温度	\mathbb{C}	150
入口含尘浓度	g/Nm³	
出口烟尘排放浓度	Mg/Nm³	<50
滤袋寿命	Н	30000


烟囱		m	出口直径高 100	
循环水系统	循环水泵 (卧式双吸)			
	型号		400SS94TJ	
	台数	台	4	
	扬程	M	92	
	流量	M³/h	1850	
	出口直径	mm	DN400	
	转速	r/min	1480	
	生产厂家		山东双轮集团有限公司.	
			上海东方泵业集团有限公司	
	配用电机型号		YKK5003—4(1#3#软启动,2#4#变频)	
	额定功率	Kw	630	
	电压	kV	10	
	电流	A		
	转速	r/min	1480	
	生产厂家		佳木斯电机股份有限公司	
	补水箱(玻璃钢装配	M ₃	100m ³	
	式)			
	数量	座	1	
	补水泵 (立式)			
	型号		100—480/2A—F—A—BAQE	
	台数	台	2	
	扬程	M		
	流量	M₃/h		
	出口直径	mm	DN125	
	 转速	r/min	2960	
	生产厂家		法国(中国制造)	
	配用电机型号		MMG200LA—2—55FF350—E2	
	额定功率	Kw	37	
	电压	V	380	
	电流	A		
	转速	r/min	2960	
	旋流除污器			

	数量	台	2
	压力	MPa	
	接口直径	mm	600
	筒体直径	mm	1600
	生产厂家		济南张夏供水设备厂
	磷酸盐加药装置		
	型号		
	数量	套	1
	生产厂家		浙江爱力浦泵业有限公司
	外形尺寸	mm	3000*2400*2400
	用电总功率	kw	7
	电压	V	380/220
	净重	kg	1000
	运行荷重	kg	2500
	磷酸盐溶液箱		
	数量	台	1
	溶积	M ³	
	搅拌器电机功率	km	
	磷酸盐加药泵		
	数量	台	2
	型号		
	最大流量	L/H	100
	最大出口压力	MPA	
	功率	KW	
	数量	台	2
	数量	台	2
	数量	台	1
换热机组	换热机组		
	换热功率	Mw	4
	采暖供回水温度	\mathbb{C}/\mathbb{C}	80/60
	板式换热器面积	m²	80
	循环水泵		
	型号		ISG125—160A

	数量	台	变频,2台
	扬程	M	28
	流量	M ₃ /h	150
	转速	r/min	2900
	生产厂家		上海上一泵业制造有限公司
	配用电机型号		Y160L—2
	额定功率	Kw	
	电压	kV	
	电流	A	
	转速	r/min	2930
	生产厂家		沪杰电机制造有限公司
除渣系统	1滚筒冷渣机(变频)		
	型号		PW10
	出力	t/h	10
	输送介质		渣、灰、矸石、煤
	物料粒度	mm	0~30
	冷却介质		软化水
	介质温度(入口/出口)	\mathbb{C}/\mathbb{C}	35/60
	物料温度(入口/出口)	\mathbb{C}/\mathbb{C}	1000/80
	冷却水进口压力	MPa	<~

L

二、组织结构图

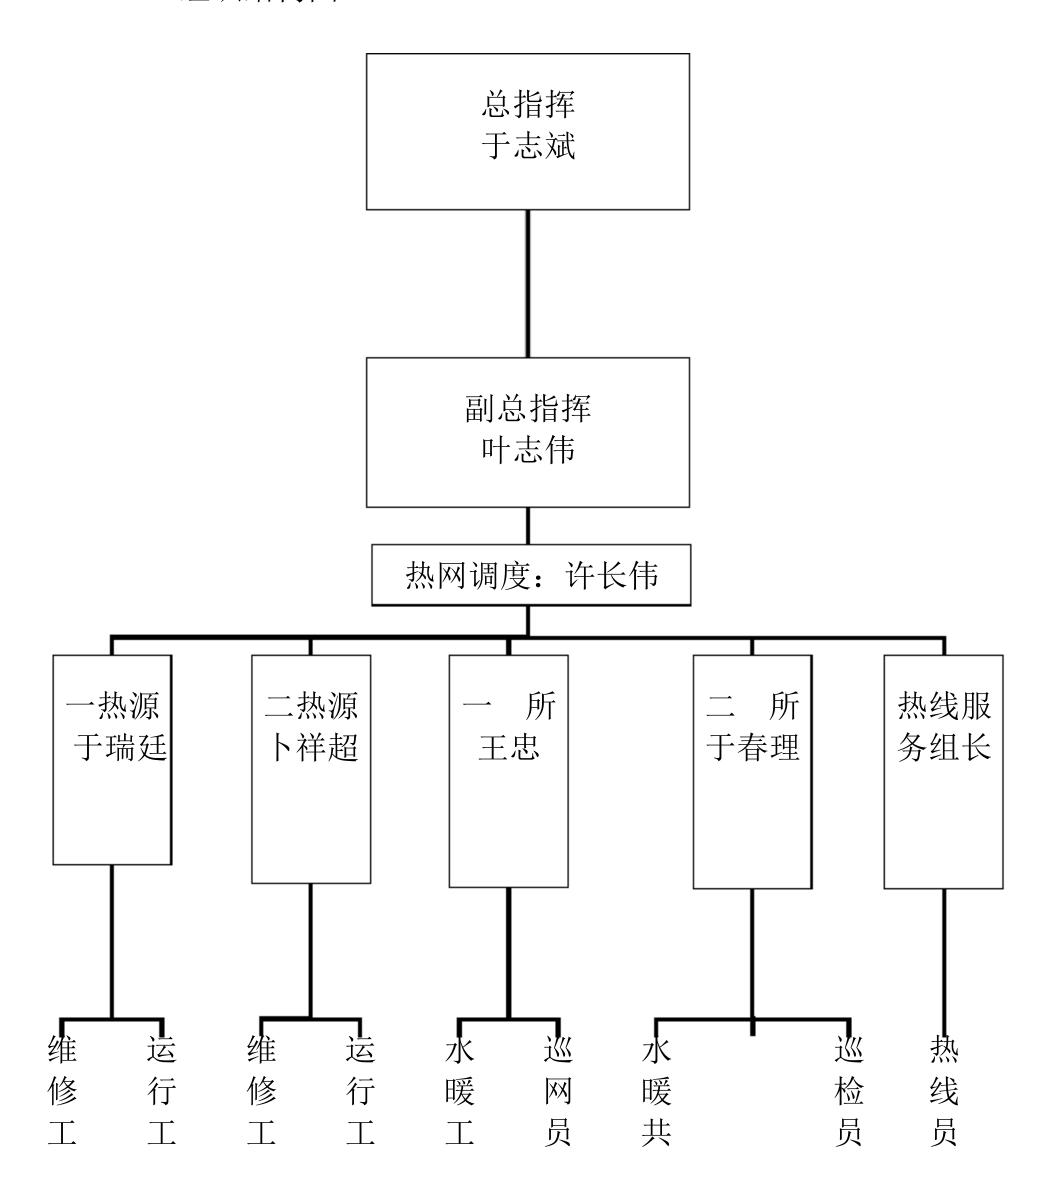

第二章 供热预备

- 三、供热管网注水方案
- 3. 一、注水前预备工作
 - 、时刻安排: 2016年10月25日前
 - 、人员预备
 - a) 指挥长: 1名,负责管网冲洗全进程的人员调度和进度治理。
- b) 网格长: 2 名, 负责小组成员的治理和责任区域内供热管网冲 洗质量、冲洗进度的整体操纵。
- c)操作工: 一二热源和一所、二所水暖工及维修人员,严格依照 总指挥及各组长按排,进行具体设备操作。
 - 、区域划分:
 - 一热源:一热源首站
 - 二热源: 二热源首站
 - 一所: 利民大道以东所有供热管网 (一所所管范围)
 - 二所: 利民大道以西学院路所有供热管网 (二所所管范围);
 - 、工具及材料预备

各班组依照常规维修需要,向公司领取经常使用工具各一套,包括管钳、F扳手、活扳手、焊机、移动电瓶车、螺丝刀、卡丝钳、测电笔、手电、对讲机等。材料预备:管件阀门、焊材、管接、活接、内直、外直、麻绳、生胶带、跑风及热熔管件等。

、注水点预备

共5个注水点,(一所2个:利民大道桥1处、南京路转盘道1处、

二所3个:利民大道与学院路交口处1个、信息学院1个、四排干1处)。远端(福利院、新湖别墅等)管网排气阀要安排专人反复排气,生技室、各所长要亲自到现场检查。

各注水点注水量如下:

序号	注水点	注水量 (m ₃ /h)	序号	注水点	注水量 (m³/h)
1	一热源	15			
2	二热源	60			

总注水量约为80m3/h(注水以二热源为主)

、一次管网注水

- 、时刻安排: 2016年9月26日—10月5日
- 、注水前检查工作
- 、确保设备已安装到位,管道、阀门安装已完成,阀门开启灵活。 没有安装到位的设备,确保已与一次网断开。
- 、阀门应灵活靠得住,状态应符合要求,泄水及排气阀应周密,运转设备手动盘车灵活。
- 、电气设备接线无误,仪表应齐全、准确,安全装置应靠得住、有效。动力设备经单机试运,点动合格,旋转方向无误。
- 、关闭热力站二次网供、回水阀门,打开连通管阀门,并确保一次 网压力表,温度计齐全且完好。
- 、确保所有注水点自来水供水正常,水处置及补水设备应具有运行条件,保证补水箱水已注满。
 - 、支架、卡板、滑动支架应牢固靠得住。

- 、检查室内应无积水、杂物。
- 、井盖应齐全、完好, 爬梯、护圈、操作台及护栏应完好。
- 、各负责小组人员依照各自大责区域,以一次网系统上的排汽点为节点,每一个节点的责任人到位。
 - 、告知自来水公司,确保注水进程不阻碍城区居民用水。
 - 、提早向网内充水热用户、社区及单位发出公告。
 - 、《供热管网注水记录表》已发放到位。
 - 、管网注水注意事项及要求
 - 、注水应按地形由低到高, 由近及远。
 - 、注水速度应缓慢、匀速。
 - 、应先对回水管注水, 充满后通过连通管或热力站向供水管注水。
 - 、注水进程中应随时观看排气阀,待空气排净后应将排气阀关闭。
 - 、注水进程中和注水完成后应检查管线,不得有漏水现象。
- 、当供热系统充满水达到运行方案静水压力值时,方可启动循环水泵。
- 、供热系统升压进程中应操纵升压速度,每次升压后,应付供热管 网进行检查,无异样后方可继续升压。
- 、当供热管网压力接近运行压力时,应试运行 2h。试运行的同时应付供热管网进行检查,无异样方可启动热力站。
 - 、管网注水操作

由总指挥下达命令,通知副指挥及调度开始对各热源及一所、二所 节点负责人下达预备注水前操作,打开一次网主线及分支上所有操纵 阀门、站内主网的连通阀门和排气阀。

、打开热网及站内所有排气阀,并派专人巡视;专门注意的是,热网系统排气是一个极为重要的环节,绝对不能操之过急见水就关阀门,应该反复排气。具体阀门状态如下:

a 热网加热器汽系统各阀门应符合下列位置:

进汽管道疏水门 开启

热网加热器至除氧器空气门 关闭

b 热网加热器疏水系统各阀门应符合下列位置:

疏水泵入口门 开启

密封水和冷却水门 开启

疏水泵出口门 开启

c 循环水系统各门应符合下列位置:

热网回水总管电动门 开启

热网供水总管电动门 开启

各热网加热器进、出口门 关闭

各热网循环泵入口门 开启

循环水道上所有放空气门 开启

d 热网补水系统各阀门符合下列位置:

各补水泵入口门 开启

各补水泵出口门 关闭

 补水调整门前后截断门
 关闭

 补水调整门旁路门
 开启

 补水管道放水门
 关闭

 生水补水电动门
 关闭

同时打开所有注水点自来水与供热一次网的连通阀门,利用自来水压力向系统注水。首站注水量不宜超过 200m³/h,以避免造成城区自来水压力陡降。(启补水泵)

- 、依照注水速度,由副总指挥通知长,注意排汽阀出水情形。当发觉排汽阀出水时,即可关闭该排汽阀,把出水时刻上报记录员,然后依照总指挥指示,当即赶到下一个责任节点。
- 、各组员在观看各节点的同时,需检查责任节点之间的管道、阀门等连接处是不是有跑、冒、滴、漏的情形,若是发觉,当即上报网格长,由网格长上报副总指挥,副总指挥应安排人员进行紧急维修,同时上报总指挥并依如实际情形,确信是不是需要停止注水,如需停止注水,必需在维修完毕,由网格长上报副总指挥,由副总指挥取得总指挥同意后,方可继续注水。
- 、记录人员要时刻观看自来水压力与系统当前压力,一但发觉自来水压力低于或等于系统当前压力,应当即关闭自来水阀门,若是现在自来水压力回升,而且微高于系统压力,则表明自来水压力已大体与系统压力平稳,需上报总指挥,补水系统需切换成补水泵补水。若是关闭自来水系统,自来水压力仍低于系统压力,表明自来水压力已不能用于系统补水,在上报副总指挥的同时,落实自来水压力可否短时

刻内恢复压力。若短时刻内不能恢复压力,应在副总指挥及网格长的安排下,启动补水泵。

- 、启动补水泵的同时打开补水箱进水管,确保补水箱水位已满;
- 、记录人员记录下开始时刻。注水期间,并对水箱水位高度进行不时观测。
- 、当最高处节点负责人上报排汽阀出水后,待首站二次回水压力达到时,记录员记录下的同时,上报网格长和副总指挥,注水完成,并提交《供热管网注水记录表》。副总指挥召集所有参与管网冲洗的人员,进行管网冲洗预备,并向总指挥上报整体进度。
 - 、管网冲洗
 - 、时刻安排: 2015年10月13日—10月15日
 - 、启动首站1#循环泵
 - 、关闭循环泵出口阀门, 开启入口阀门。
 - 、检查转动部件润滑油的质量、数量应符合设备技术文件的规定。
 - 、盘车灵活、正常。
 - 、泵体内已注满水,并排净空气。
 - 、在水泵出口阀门关闭的状态下启动1#循环水泵。
- 、启动水泵后,慢慢将频率升至 20Hz,稳固 30 秒后,缓慢开启循环水泵出口阀门,同时观看循环水泵出口压力表数值及电流表是不是稳固,无问题后,开启循环水泵出口阀门至 30 度,再次观看循环水泵出口压力表数值及电流表数值,若是无异样,提升循环泵频率至 35Hz,流量操纵在 700m3/h,若是循环水泵出口压力表及电流表数值

仍无异样, 表明循环泵已正常启动。

、循环泵在 2h 的运转期间内不该有不正常的声音;各密封部位不该 渗漏;各牢固连接部位不该松动;转动轴承的温度不该高于 75℃; 填料升温正常,一般软填料宜有少量的渗漏(每分钟 10—20 滴); 电动机的电流不得超过额定值;振动应符合设备技术文件的规定,当 设备文件无规按时,用手提式振动仪测量泵的径向振幅(双向)不该 超过下表,泵的安全爱惜装置灵敏、靠得住。

泵的径向振幅(双向)

转速 (r/min)	600750	7501000	10001500	15003000
振幅不应超过				
(mm)				

、管网冲洗操作

- 、依照由远到近的原则,先打开中岳大街西支线(包括嵩阳路南段支线),确保其他支线阀门处于关闭状态。
 - 、确保首站内各排汽阀处无集汽,泄水阀门无渗漏。
- 、记录员记录下开始循环时刻,循环需持续1个小时,网格内维修人员应付循环供热支线进行管网巡检,及时发觉跑、冒、滴、漏现象。、待循环1小时后,降低循环水泵频率至20Hz,关闭循环水泵出口
- 阀门至5度,关闭首站内二次回水总阀门,维持补水泵定压为。
- 、打开南环二路回水排污阀,进行排污。排污阀操作人员与首站记录 人员随时维持联系,若是首站回水压力低于,记录人员应及时通知排 污阀操作人员,停止排污,继续注水。排污成效以无浑水排出为止, 排污人员若是发觉排出水质一直很差,需告知组长,待首站回水压力

恢复至时, 需再次开启排污阀, 直至无浑水排出。

- 、若是反复排污两次以上,才显现清水的情形,为避免是管网再次杂质沉淀而造成的"假象",需再次提升循环泵频率至 40Hz,循环 30分钟后,重复以上排污工作,直至无浑水排出,表明此管段冲洗完成,清洗该管段上各支线除污器。
- 、冲洗管道内流速不小于 1m/s, 对应流量如下表。每一条支线冲洗 完成, 应关闭该支线阀门后, 进入下一管段的冲洗工作。

管径	流量(m3/h)	管径	流量(m³/h)	管径	流量(m³/h)
DN250	200	DN350	390	DN450	610
DN300	280	DN400	500	DN600	1100

管径流量对照表 (v=1m/s)

- 、南环二路排污阀负责中岳大街以南管网排污,中岳花园支线排污阀负责中岳大街以北管网排污。
- 、待整个管网冲洗完成后,首站除污器需清洗干净。

四、供热冷运行方案

- 、预备工作
- 、人员预备
- a)总指挥: 1 名,负责管网冷运行全进程中公司内部工作的统筹和谐和进度治理。
- b) 副总指挥: 2 名,负责管网冷运行全进程的人员调度和进度治理。
 - c) 网格长: 2 名, 治理网格区域内冷运行全进程的执行情形。

- d)维修人员: 40 人,每一个网格 20 人,严格依照组长按排,进行具体设备操作及维修工作。
- e)运行工: 12人,负责各热力站内参数的记录和站内情形实时上报。
 - f) 热线员: 3人,负责接听热线、做好热线记录。
- g)调度: 1 人, 汇总运行参数并进行分析, 上传工作进度情形, 下达运行、调剂指令。
 - 、工具预备

各网格区域内需配备经常使用工具各一套,包括管钳、F 扳手、活扳手、螺丝刀、卡丝钳、测电笔、手电、对讲机、钎子、倒链、氧气、乙炔、汽割、电焊机、焊条等。

- 、管网注水
- 、时刻安排:
- 一次网注水时刻: 2015年10月16日—10月25日
- 二次网注水时刻: 2015年10月20日--10月31日
- 、供热一次管网注水
- 、方案同冲洗注水方案相同。
- 、注水完成后,统一组织对一次网系统中所有放气阀逐个进行放气,确认管内无气体后,关闭放气阀。
 - 、二次网注水
 - 、注水前预备工作

在开始注水前,各网格长应配合经营进展中心人员,提早以书面形

式告知用户,内容包括:用户(社区)名称、注水起止时刻,用户需配合哪些工作等。

确保设备已安装到位,管道、阀门安装已完成,系统中不存在未连接管段。

新建热力系统及连接管道已水压实验合格。

热力站内电气设备接线无误,线路调试合格,动力设备经单机试运,点动合格,旋转方向无误。

混水站要确保一次网阀门已开启。间接连接系统要确保,自来水供水正常,补水箱水已注满。

确保所有最高点排汽阀已打开。

- 、用户系统注水操作
- 、严格依照《2014-2015 供热运行用户系统注水时刻打算表》,依次 对用户系统进行注水。
- 、各网格内注水顺序为先注间接连接系统,混水连接和直接连接系统,待一次网冲洗完成后,随一次网开始注水。
- 、各个网格区域对混水连接和直接连接系统注水时,由于此类站需要首站直接注水,因此第一贯总指挥上报需要注水热力站名称,待总指挥许诺后,先缓慢打开站内用户侧回水至5度,然后注意观看站内排汽点情形,并与室外系统最低点排汽阀观看人员取得联系。
- 、用户系统注水前期,由于各网格内的混水站同时注水的可能性较大,因此在开始注水前,要与首站记录员取得联系,若是首站压力较稳固,可开启阀门至15度左右。

- 、间接连接系统, 注水时刻可依照网格内工作的具体安排, 在向总指挥上报后,即可开始注水。但应保证注水进程中板式换热器一、二次双侧压力差不能超过, 尤其高区系统最好与一次网同时注水。
- 、注水期间,维修人员要随时观看社区内供热管网情形,若是发觉有严峻漏水情形,当即停止注水,同时上报总指挥。待维修完毕后方可恢复注水。
- 、各网格长要及时上报管辖区域内管网的注水进度,以便合理调整工作时刻,加速其他网格区域的进度。
- 、当所有网格内混水连接和直接连接系统完成注水后,上报副总指挥及总指挥,依照总指挥的统一安排,若是时刻紧迫,许诺在部份间接连接系统未完成注水的情形下,开始冷运行。
 - 、冷运行
 - 、时刻安排: 2015年11月1日—11月5日
 - 、冷运行前预备工作
 - 、确保所有混水连接和直接连接系统已完成注水。
 - 、确保所有热力站内一次网阀门恢复到去年开启状态。
 - 、冷运行操作
 - 、除最不利环路外, 关闭其他支线总阀门。
- 、依照管网冲洗方式中,启动首站 1#循环泵,频率升至 30Hz,记录下现在水泵的扬程和流量。
 - 、各站运行人员到位, 领取运行记录表。
 - 、依次开启最不利环路上所有间供换热站一次网阀门及调剂阀, 开

度以去年开度为准,若是许诺,借助便携式流量计,依如实际负荷以m2的流量对各间供换热站进行等比例分派。

- 、各站运行人员开始记录站内运行参数,并注意观看参数转变,及时上报网格长。
- 、最不利环路中所有换热站正常启动后,从该供热支线最未端一座 混水站开始启动混水泵,
- 、混水泵启动前,确保供热一次网及混水管上阀门及调剂阀开启至 去年开度,记录下此刻站内一次网运行压力。
- 、关闭混水泵出口阀门,确保站内电器设施完好无误后,启动1#混水泵,缓慢开启出口阀门,依照3L/m2的流量,调剂循环泵频率。
- 、此刻混水站一次网供、回水压力与混水泵未启动前做对照,供水压力降低不得超过,回水压力升高不得超过,若是波动过大,可通过调剂混水阀门进行操纵。
- 、最不利环路中所有混水站启动完毕后,对该环路上所有热力站的运行参数进行汇总分析,各站一次网流量与首站流量大体吻合,表明该环路已正常启动,可开启下一条支线。
- 、各支线开启前,先估量首站需提供流量及扬程,待首站调剂完成后,方可开启该支线。支线总阀门开度均以去年开度为准。
- 、依照以上方式,均应遵循"先间供,后直供,先远端,后近端"的启动顺序,直至最近端支线正常运行,首站 1#循环泵达到正常初期运行参数:频率 36Hz,扬程 30mH₂O,流量 1000m₃/h,各热力站一次网流量为 m₂左右。运行参数接近以上数据后,上报总指挥,冷运行

初调剂完成。

五、升温及试运行

- 、时刻按排: 2015年11月12日—11月14日,如有特殊要求,依照要求时刻开始。
- 、人员安排:人员组织同冷运行,60 名维修工,27 名运行工全数到 岗。
- 、升温前预备工作
- 、提早以书面形式告知用户,注意室内系统因管道受热膨胀显现漏水的情形。
- 、所有管网及热力站通过巡检、未发觉跑、冒、滴、漏的情形。
- 、各网格区域运行人员、维修人员已到位。
- 、首站一次网补偿器状态正常。
- 、管网升温
- 、依照总指挥安排,由调度员通知电厂,开始投汽,温升以5℃/h为宜,不得超过10℃/h。
- 、电厂热水大约通过2小时40分钟可抵达首站,首站运行人员做好运行记录。
- 、各热力站升温进程中,网格区域维修人员应付供热系统中所有设备、管道、支吊架、补偿器、阀门、管件、仪表等设施进行巡检查,巡检周期不该大于1h。
- 、当温度升至接近运行温度时,巡检人员应付所有螺栓进行热拧紧。
- 、温度升至运行温度后, 进入试运行时期。

- 、试运行及供热初调剂
- 、试运行期间,所有运行工作及参数操纵均应以正常运行时为标准,该时期要紧工作为初调剂。
- 、初调剂要紧依据流量和温度对供热一次网和二次网进行从头调整。
- 一次网流量分派以 m_2 为标准,二次网流量以 $3L/m_2$ 为标准,二次侧供/回水温差维持在 12° $\mathbb{C} \sim 15^{\circ}$ \mathbb{C} 左右,但回水温度不得低于 42° \mathbb{C} 。
- 、持续运行72小时,所有供热设施无任何故障后转入正式运行。
- 、完成初调剂的供热系统,任何人不得擅自对任何调剂设备进行操作,如需操作,必需上报总指挥,经许诺后方可操作,不然,视为违规操作。

第三章、供热运行

六、供热运行时刻治理

- 、供热运行时刻: 2015年11月15日—2016年3月15日, 共计121 天, 如有特殊情形, 另行确信。
- 、运行时期划分:
- a、11月15日—12月30日: 维修顶峰期

工作目标:排除流量分派不均,使供热运行进入平稳期。

b、1月1日—2月15日: 运行平稳期

工作目标:维持供热安全、稳固、高效运行。

C、2月16日—3月15日: 节能操纵期

工作目标:利用天气回暖,作好节能操纵。

七、季节工数量操纵

- a、维修顶峰期:维修人员60人,运行人员27人;
- b、运行平稳期:维修人员40人,运行人员27人;
- c、节能操纵期:维修人员30人,运行人员27人;

八、供热运行

- 、供热设备巡检
- 、供热设备天天应巡检一次,巡检工作由各网格长组织,巡检小组每组不得少于2人。

、看

- a、设备内外的清洁、完整;
- b、表、液位灯光信号指示是不是正常;
- c、控制开关、阀门启闭是不是灵活靠得住;
- d、有无跑、冒、滴、漏的现象;
- e、管网及设备周边有无存在其他工程现场的情形;
- f、管网及设备周边有无易燃物堆放的情形;
- g、架空管道及设备有无保温温或爱惜层脱落的现象;
- H、直埋管网地面有无浸湿或显现地面局部无积雪的现象;

、听:

- a、转动设备转动声是不是均匀,有无异声;
- b、电气设备有无放电声;

c、水箱、水管的流水声是不是正常;

、闻:

- a、有无绝缘漆的焦味;
- b、 无橡胶、塑料、棉织物的焦味;
- c、有无热水漏出的特有气味。
- 、用户服务
- 、热线员在接到用户热线后,依照用户需解决问题的类型,做好详细记录,并依照责任网格区域进行分类;
- 、各网格长天天至少分上午和下午两次领取维修单,若是维修任务不大,可与热线员随时联系,及时处置用户问题。
- 、各网格区域至少向用户发布1个维修人员的电话号码,用户可直接 与维修人员联系。
- 、无特殊情形,用户反映的问题,无得显现超过1个工作日仍未处置的现象。
- 、接线员要详细记录每一张维修单的领取时刻和反馈时刻,反馈情形将做为网格绩效考核的依据。
- 、运行调剂
- 、各站运行人员做好运行参数记录,若是发觉运行参数异样,应当即上报网格长,如需对运行参数进行调整,由网格长上报总指挥,经许诺后,方可进行调整。
- 、运行调剂统一由总指挥给出调剂指令,由各网格操作人员执行。任何人员未经总指挥同意,不得擅自对任何设备进行调剂;

- 、运行调剂在初调剂的基础上,仍然依照一次网流量 m_2 ,二次网流量 $3L/m_2$,二次侧供/回水温差维持在 12 $\mathbb{C} \sim 15$ \mathbb{C} 左右,但回水温度不得低于 42 \mathbb{C} 的标准进行调剂。
- 、首站运参数依照天气转变和实际热负荷,以理论计算为指导,由总 指挥下达调整指令,首站运行人员人员严格执行。
- 、调度中心要详细记录首站及热源厂的运行参数和调剂情形,各热力站运行人员要详细记录各热力站的调剂。
- 、1#、2#循环泵切换
- 、两台循环泵依如实际运行情形,每一个月切换1次。
- 、1#循环泵切换 2#循环泵时, 先降低 1#循环泵频率至 30Hz, 关闭水泵出口阀门至 20 度, 然后打开 2#循环泵入口阀门, 依照循环泵启动流程, 启动 2#循环泵, 频率调止 30Hz。停止 1#循环泵, 关闭 1#循环泵进、出口阀门。调 2#循环泵频率至需要值, 观看 20 分钟无异样情形, 切换完成。
- 、2#循环泵切换 1#循环泵方式同上。

九、停止供热

- 、时刻安排: 2016年3月15日上午10:00钟以前。
- 、人员安排: 同运行人员安排
- 、停止供热操作
- 、2016年3月14日前,由各网格长负责,对各个社区及单位以书面告知停暖时刻及停暖安排。
- 、2016年3月14日晚上12:00准时通知热源厂切断汽源,但维持

其他设备正常运行;

- 、2016年3月15日凌晨零点准时通知热源厂停止所有供热设备,热源厂与热力公司高度员一起对热计量数据进行抄写备案后,两边一起对计量仪表上锁封存。
- 、2016年3月15日8:00准时开始停止运行各为力站,各网格长负责,在上午10:00以前完成停运。上报总指挥,供热运行终止。十、紧急事件及处置方案
- 、首站板式换热器堵塞紧急事件及处置方案
- 、板换反冲洗
- 、人员预备
- a)、总指挥1人,负责事件处置进程的人员调度和治理;
- b)、班长: 1人,负责事件处置进程的具体操作方式及进度;
- c)、操作人员: 2人,负责具体操作。
- 、处置方法
- a)、由调度人员通知热源厂降低供水温度至75度左右;
- b),待首站一次网供热温度降至与热源厂温度一致,降低循环泵频率至20Hz;
- c)、完全打开备用板式换热器进、出口阀门,关闭需要冲洗板式换热器二次出口阀门,确保二次网压力正常;
- d)、快速打开板式换热器排污阀,让循环水逆流通赤板式换热器,进 行反冲洗;
- e), 当二次网回水压力降至时,关闭排污阀,让系统压力恢复正常;

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/40713215412
2006045
